

稷山县 2021 年度一事一议财政奖补项目 绩效评价报告

项目名称：稷山县 2021 年度一事一议财政奖补项目

委托单位：稷山县财政局

评价机构：山西冰佳项目管理有限责任公司

2023 年 3 月

目 录

摘 要	- 1 -
一、概述	- 1 -
二、资金投入和使用情况	- 2 -
三、绩效评价结果	- 2 -
四、项目实施及管理过程中存在问题	- 3 -
五、下一步改进意见	- 4 -
一、项目基本情况	- 5 -
（一）项目背景	- 5 -
（二）项目实施情况	- 6 -
（三）资金来源和使用情况	- 8 -
二、绩效评价工作开展情况	- 13 -
（一）绩效评价目的、对象和范围	- 13 -
（二）绩效评价依据	- 14 -
（三）绩效评价原则与方法	- 15 -
（四）评价指标体系	- 17 -
（五）评价工作组	- 18 -
（六）绩效评价工作过程	- 19 -
三、综合评价情况及评价结论	- 22 -
（一）评价结果	- 22 -
（二）评价结论	- 22 -
四、绩效评价指标分析	- 24 -
（一）项目决策指标绩效分析	- 24 -

(二) 项目过程指标绩效分析	- 28 -
(三) 项目产出指标绩效分析	- 35 -
(四) 项目效益指标绩效分析	- 46 -
五、存在的问题和建议	- 54 -
(一) 存在问题	- 54 -
(二) 相关建议	- 54 -
六、下一步改进意见	- 55 -
七、绩效评价结果应用建议	- 55 -

摘 要

山西冰佳项目管理有限责任公司受稷山县财政局委托，对稷山县 2021 年度一事一议财政奖补项目进行绩效评价，现将相关情况摘要如下：

一、概述

“一事一议”制度是指在农村税费改革这项系统工程中，取消了乡统筹和改革村提留后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。2012 年起中央开始在全国范围推广实施《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（财农改〔2011〕3 号），鼓励农民和村集体的参与，“在农民筹资筹劳到位后给予相应的财政奖补”“按照村民议定、村级申报、乡镇初审、县级审批的程序”进行村级公益事业建设。《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》进一步指出“推广一事一议、以奖代补等方式，鼓励农民对直接受益的乡村基础设施建设投工投劳，让农民更多参与建设管护”。

本次评价主要对稷山县 2021 年度一事一议财政奖补项目进行绩效评价。评价组通过采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，从决策、过程、产出、效益四个维度进行了绩效评价。

二、资金投入和使用情况

稷山县 2021 年度一事一议项目投资资金总计 1495.045749 万元。其中筹资筹劳 6.4474 万元，财政奖补资金 1488.598349 万元。财政奖补资金中，中央和省级财政资金 1111.507887 万元，县级资金 377.090462 万元。

2021 年度收到中央、省级财政奖补资金 1112 万元，根据分配计划分配到项目 1111.507887 万元，结余 0.492113 万元。

截至 2023 年 3 月 1 日，项目资金拨付乡镇到位 1205.464887 万元，其中包括筹资筹劳的 6.4474 万元。项目已支付工程款项资金 1093.892287 万元。

三、绩效评价结果

本次绩效评价结果采用综合评分定级方法，通过数据采集、现场核查、问卷调查、现场访谈等方式对稷山县 2021 年度一事一议项目进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 88.1 分，属于“良”。其中，决策、过程、产出、效益指标权重及得分情况见表 1 及表 2。

表 1 各村项目绩效评价得分情况表

项目村	项目投资	权重	绩效评价价值	综合得分
西薛村	147.7715	0.10	96.83	9.57
西店头村	189.128	0.13	96.79	12.24
阳史村	387.396451	0.26	96.96	25.12
阳城村	467.169798	0.31	82.85	25.89
店头村	20.69	0.01	93	1.29
太阳村	252.3	0.17	79.3	13.38
佛峪口村	30.59	0.02	64	1.31
合计	1495.045749	1.00		88.81

表 2 各乡镇项目绩效评价得分情况表

乡镇	项目投资	权重	绩效评价值	综合得分
稷峰镇	724.295951	0.48	96.89	46.94
清河镇	487.859798	0.33	83.28	27.18
太阳乡	252.3	0.17	79.30	13.38
化峪镇	30.59	0.02	64.00	1.31
合计	1495.045749	1		88.81

1.决策方面：立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学，为稷山县 2021 年度一事一议项目建设打下了坚实的基础。

2.过程方面：预算资金全部到位、预算执行率达标、制度执行较有效，为 24 个项目实施提供了资金保障。

3.产出方面：24 个项目均已完工，已验收部分除了一些项目建设内容变更较大，基本完成预计工程量，还有些项目未进行工程验收。

4.效益方面：24 个项目的实施，均为项目周围群众改善了人居环境，便利了日常生活，解决了稷山县当前农村亟待解决的民生短板问题，群众的满意度较高，为后续年度的一事一议项目开展，奠定了基础。

从全面实施预算绩效管理的角度来看，稷山县 2021 年度一事一议项目，因部分项目村工程相关资料不齐全以及项目验收滞后等原因，很大程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效评价的分值。

四、项目实施及管理过程中存在问题

1.资金使用单位缺乏绩效管理理念

经与资金使用单位管理人员交流沟通，并查阅各项管理制度了解到，目前项目单位的工作实施重点和资金管理重点，仍然停留在是否按计划完成任务、有无违规违纪问题等传统管理层面上，对绩效理念、资金效益、绩效管理比较缺乏，绩效考核过于注重结果，而忽略了各个环节的执行。

2.项目实施过程要求缺少规范与标准

通过项目相关资料的查阅，发现一事一议项目实施过程缺少对项目实施质量以及项目实施进度的监督管理。对于不同投资金额的项目，缺少分类标准以及分类要求。对项目前期规划与预算缺少相关要求，导致前期准备不足，项目建设内容变动较多，工期延长。

五、下一步改进意见

1.各乡镇政府应严格执行年度预算，进行正确的财务核算，对本项目未使用资金考虑合理安排，以保证资金的安全高效使用。

2.各乡镇政府应严格执行有关规定，追踪并监督各村项目资金的使用，推动项目及时落地。

3.各乡镇政府应制定相关项目管理制度，及时完整地收集整理相关档案资料，以保障项目实施，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

稷山县 2021 年度一事一议项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景

“一事一议”制度是指在农村税费改革这项系统工程中，取消了乡统筹和改革村提留后，原由乡统筹和村提留中开支的农田水利基本建设、道路修建、植树造林、农业综合开发有关的土地治理项目和村民认为需要兴办的集体生产生活等其他公益事业项目所需资金，不再固定向农民收取，采取“一事一议”的筹集办法。2012年起中央开始在全国范围推广实施《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（财农改〔2011〕3号），鼓励农民和村集体的参与，“在农民筹资筹劳到位后给予相应的财政奖补”“按照村民议定、村级申报、乡镇初审、县级审批的程序”进行村级公益事业建设。《乡村振兴战略规划（2018—2022年）》进一步指出“推广一事一议、以奖代补等方式，鼓励农民对直接受益的乡村基础设施建设投工投劳，让农民更多参与建设管护”。

政府相关文件规定“一事一议”的开展必须以“量力而行、群众受益、民主决策、上限控制、使用公开”的原则为前提，同时在召开时，要求应有本村满18周岁及以上村民的半数参加或者有本村2/3以上村民代表参加，所作决定要经到会人员的半数

通过才能有效。“一事一议”政策实施过程中议事程序要遵循“群众自愿、权利义务一致、公平负担”的议事原则，以便能够最大程度上尊重和保护村民的基本权益。

（二）项目实施情况

稷山县 2021 年度一事一议项目共计涉及 4 个乡镇，7 个村，共计 24 个项目，其中稷峰镇涉及三个村，17 个项目；清河镇涉及 2 个村，5 个项目；太阳乡涉及 1 个村，1 个项目；化峪镇涉及 1 个村，1 个项目。

稷山县一事一议项目，由村及村民根据本村具体情况，针对迫切需要改善和建设的项目，进行村民代表大会商讨，制定实施方案和酬劳筹资方案。通过公示公开等相关制度，形成项目清单上报乡镇政府，经乡镇初审，县相关部门复审，筛选项目进入一事一议项目库。

项目入库后，财政局相关股室制定本年度的资金分配计划，村集体将筹资转入镇政府账户，由镇政府具体实施专项资金的统筹管理。

项目由镇政府、村集体和村民共同监督，监管工程进度及工程质量，做到全过程的透明公开。根据施工进度进行分批次的支付工程款，在进行交工验收及竣工决算后支付尾款。

稷山县 2021 年度一事一议项目共有 24 个项目，目前均已完工，部分项目还未进行竣工决算，因此存在款项未完全支付的情

况。项目具体见表 1-1 所示。

表 1-1 稷山县 2021 年度一事一议项目清单

序号	主管单位	实施单位	项目名称	项目类型
1	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村建筑外立面装饰、街巷硬化、污水管及残垣断壁修复工程	其他公共设施
2	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村群众文化活动中心	村级公共活动场所
3	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头主街道下水道改造工程	村内小型水利设施
4	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头通村道路提升改造及街道硬化工程	村内道路
5	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头残垣断壁修复、墙体立面装饰及人行道修复工程	村内道路
6	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头文化广场提升改造工程	村级公共活动场所
7	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（洞子门修复）工程	村容美化亮化
8	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌美化（建筑外立面装饰及精神堡垒改造）工程	村容美化亮化
9	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村路灯安装工程	村容美化亮化
10	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村文化广场提升改造工程	村级公共活动场所
11	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村游园改造工程	村级公共活动场所
12	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村下水道改造及混凝土路面恢复工程	村内小型水利设施
13	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村庄绿化工程	村容美化亮化
14	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史环村护坡绿化工程	村容美化亮化
15	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村美丽乡村建设工程	其他公共设施
16	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史主街道改造工程	村内道路
17	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（挡土墙）工程	村容美化亮化
18	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目	村容美化亮化
19	清河镇人	阳城村	阳城村吃水管网改造工程	其他公共设施

	民政府			
20	清河镇人民政府	阳城村	阳城研学基地改造工程	村容美化亮化
21	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目附属工程	村容美化亮化
22	清河镇人民政府	店头村	店头村公共活动场所	村级公共活动场所
23	太阳乡人民政府	太阳村	太阳村建设改造项目	其他公共设施
24	化峪镇人民政府	佛峪口村	佛峪口舞台维修改造	其他公共设施

(三) 资金来源和使用情况

1. 项目资金来源

稷山县 2021 年度一事一议项目资金总计 1495.537862 万元。本年度收到财政奖补共计 1489.090462 万元，其中中央和省级财政资金 1112 万元，县级乡村振兴资金 377.090462 万元。筹资筹劳资金 6.4474 万元。项目资金来源情况具体见表 1-2 所示。

表 1-2 项目资金来源情况 (单位: 万元)

序号	来源	金额	文件号	时间
1	中央、省第一批资金	747	晋财农[2020]143 号	2020.12.23
2	中央、省第二批资金	365	晋财农[2021]79 号	2021.7.30
3	县级乡村振兴资金	377.090462		
4	筹资筹劳	6.4474		
5	合计	1495.537862		

2. 资金使用情况

稷山县 2021 年度一事一议项目投资资金总计 1495.045749 万元。其中筹资筹劳 6.4474 万元，财政奖补资金 1488.598349 万元。财政奖补资金中，中央和省级财政资金 1111.507887 万元，县级资金 377.090462 万元。

2021 年度收到中央、省级财政奖补资金 1112 万元，根据分配计划分配到项目 1111.507887 万元，结余 0.492113 万元。

截至 2023 年 3 月 1 日，项目资金拨付乡镇到位 1205.464887 万元，其中包括筹资筹劳的 6.4474 万元。项目已支付工程款项资金 1093.892287 万元。项目资金使用情况具体见表 1-3。

表 1-3 项目资金使用情况表（单位：万元）

序号	主管单位	实施单位	项目名称	实际投资					到位资金	实际支付金额
				合计	财政奖补			筹资筹劳		
					小计	中央、省	县级			
1	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村建筑外立面装饰、街巷硬化、污水管及残垣断壁修复工程	24.78	24.2	14.868	9.332	0.58	20.404	19.824
2	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村群众文化活动中心	122.9915	122.1215	98.147218	23.974282	0.87	99.2578	98.3878
		西薛村小计		147.7715	146.3215	113.015218	33.306282	1.45	119.6618	118.2118
3	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头主街道下水道改造工程	54.33	54.225	32.598	21.627	0.105	43.569	43.464
4	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头通村道路提升改造及街道硬化工程	51.14	50.93	30.684	20.246	0.21	41.122	40.912
5	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头残垣断壁修复、墙体立面装饰及人行道修复工程	24.36	23.73	14.616	9.114	0.63	20.118	19.488
6	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头文化广场提升改造工程	59.298	59.193	35.5788	23.6142	0.105	47.5434	47.4384
		西店头村小计		189.128	188.078	113.4768	74.6012	1.05	152.3524	151.3024
7	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（洞子门修复）工程	34.07	34.07	20.442	13.628	0	27.256	27.256

8	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村村容村貌美化 (建筑外立面装饰及 精神堡垒改造)工程	18.85	18.85	11.31	7.54	0	15.08	15.08
9	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村路灯安装工程	14.8	14.54	8.88	5.66	0.26	12.1	11.84
10	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村文化广场提升 改造工程	38.27	38.01	22.962	15.048	0.26	30.876	30.616
11	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村游园改造工程	59.17	58.91	35.502	23.408	0.26	47.596	47.336
12	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村下水道改造及 混凝土路面恢复工程	58.48	58.22	35.088	23.132	0.26	47.044	46.784
13	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村庄绿化工程	14.8859	14.8859	14.8859	0	0	14.8859	14.8859
14	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史环村护坡 绿化工程	13.222147	13.222147	13.222147	0	0	13.222147	13.222147
15	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村美丽乡村 建设工程	14.996585	14.996585	14.996585	0	0	14.996585	14.996585
16	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史主街道改造工程	30.658819	30.658819	24.527055	6.131764	0	24.527055	24.527055
17	稷峰镇 人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升 (挡土墙)工程	89.993	89.733	72.234982	17.498018	0.26	72.2544	71.9944
		阳史村 小计		387.396451	386.096451	274.050669	112.045782	1.3	319.838087	318.538087
	稷峰镇 小计			724.295951	720.495951	500.542687	219.953264	3.8	591.852287	588.052287

18	清河镇 人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目	320.413	320.413	256	64.413	0	256	256
19	清河镇 人民政府	阳城村	阳城村吃水管网 改造工程	49.165	48	48	0	1.165	49.165	48
20	清河镇 人民政府	阳城村	阳城研学基地 改造工程	51.6956	51.6956	41.3564	10.3392	0	41.3564	0
21	清河镇 人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目 附属工程	45.896198	45.896198	13.7688	32.127398	0	13.7688	0
		阳城村 小计		467.169798	466.004798	359.1252	106.879598	1.165	360.2902	304
22	清河镇 人民政府	店头村	店头村公共活动场所	20.69	20	20	0	0.69	20.69	0
	清河镇 小计			487.859798	486.004798	379.1252	106.879598	1.855	380.9802	304
23	太阳乡 人民政府	太阳村	太阳村建设改造项目	252.3	252.0976	201.84	50.2576	0.2024	202.0424	201.84
	太阳乡 小计			252.3	252.0976	201.84	50.2576	0.2024	202.0424	201.84
24	化峪镇 人民政府	佛峪口村	佛峪口舞台维修改造	30.59	30	30	0	0.59	30.59	0
	化峪镇 小计			30.59	30	30	0	0.59	30.59	0
	总计			1495.045749	1488.598349	1111.507887	377.090462	6.4474	1205.464887	1093.892287

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价的目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置，提高公共服务水平。依据有关文件规定，客观、全面、公正地评价稷山县 2021 年度一事一议项目。

(1)通过绩效评价，深入了解稷山县 2021 年度一事一议项目的投入、过程、产出和绩效方面的详细情况，了解资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化资金管理，强化支出责任，建立科学、合理的绩效评价管理体系，为政府决策和财政预算管理提供依据。

(2)督促、指导资金使用单位，严格按照政策规定用途使用资金，建立健全资金分配、管理制度，确保资金运行安全。

(3)从绩效的角度发现该项目在决策、实施和管理过程中存在的问题，寻求解决方案，为进一步深化项目管理工作提供依据，提高各职能部门管理水平，加强规范化、制度化建设，建立健全目标化管理制度，推进预算绩效管理。

2. 绩效评价的对象

本次绩效评价对象为稷山县 2021 年度一事一议项目，共计 24 个项目，项目总投资 1495.045749 万元。

3.绩效评价的范围

为深化预算管理改革,进一步加强稷山县一事一议项目资金的监督管理,提高资金使用效益,进行此次绩效评价。通过评价项目管理规范性及绩效目标的实现程度,并总结经验,发现问题,为今后完善项目的管理提供参考意见。绩效评价主要包括以下内容:

(1)项目产出情况;

(2)项目建设过程中的组织和管理状况;

(3)项目管理、组织准备、项目实施、资金使用、服务效果、公众满意等;

(4)根据实际情况确定的其他考核内容等。

(二)绩效评价依据

绩效评价依据包括但不限于:

1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);

2.《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号);

3.中共山西省委 山西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(晋发〔2018〕39号);

4.财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

5.财政部《关于印发〈村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法〉的通知》（财农改〔2011〕3号）；

6.山西省财政厅、山西省农业厅《山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补工作方案》（晋财农改〔2010〕31号）；

7.山西省财政厅《山西省村级公益事业建设一事一议财政奖补资金管理办法》。

（三）绩效评价原则与方法

1.绩效评价的原则

（1）科学规范原则

注重财政支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法。综合分析稷山县一事一议项目的资金管理、使用、绩效等因素，规范评价工作流程，科学设置评价指标体系，确保绩效评价结果科学合理。

（2）公开公正原则

本次绩效评价全过程公开透明，实施单位所提供的数据应经工作人员现场核实，第三方机构应遵循公正原则开展绩效评价工作，积极接受社会的监督，保证评价结果客观公正。

（3）系统性原则

将定量指标与定性指标相结合，以定量分析为主、定性分析为辅，系统反映预算支出所产生的社会效益和经济效益、可持续影响、社会公众满意度等。

(4) 分级分类原则

本次评价指标分一级、二级、三级指标，从多个层面对稷山 2021 年度一事一议项目进行全面评价，评价指标涵盖项目整个实施过程。

2. 绩效评价的方法

绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。为确保绩效评价工作的专业性和公平性，结合项目的特点和绩效评价指标，本次评价选用比较法、因素分析法、公众评判法作为主要评价方法，其他评价方法作为辅助方法。

(1) 比较法：通过对该项目绩效目标与实施效果、历史与当期情况、同类支出的比较，综合分析绩效目标的实现程度。项目小组根据收集的资料和实地观察，了解稷山县 2021 年度一事一议项目与该项目申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法：通过综合分析影响该项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。项目小组将对项目具体实施单位进行访谈，获取稷山县 2021 年度一事一议项目具体实施情况和效果的相关资料，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3) 公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等

对项目效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组通过调查问卷，了解社会公众对稷山县 2021 年度一事一议项目的满意程度，评价效果指标的实现程度。

同时，对相关实施内容进行现场核查，包括对相关资料的审阅、座谈走访、实地勘察等方式，核实相关资料和数据，对相关实施过程中涉及的流程进行规范性检验等。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计

综合考虑稷山县 2021 年度一事一议项目的实际情况，按照“决策—过程—产出—效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准制定指标的目标值，在可操作性和可量化方面对评价指标进行了进一步细化和调整，最终形成了稷山县一事一议项目绩效评价指标体系，具体包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标、10 个二级指标、23 个三级指标。

针对实际情况，根据各乡镇、村资金拨付量确定了权重值。具体权重见表 2-1。

表 2-1 各项目村、乡镇绩效评价权重

序号	主管单位	资金量	权重
1	稷峰镇人民政府	724. 295951	0. 48
1. 1	西薛村	147. 7715	0. 10
1. 2	西店头村	189. 128	0. 13
1. 3	阳史村	387. 396451	0. 26
2	清河镇人民政府	487. 859798	0. 33

2.1	阳城村	467.169798	0.31
2.2	店头村	20.69	0.01
3	太阳乡人民政府	252.3	0.17
3.1	太阳村	252.3	0.17
4	化峪镇人民政府	30.59	0.02
4.1	佛峪口村	30.59	0.02
	合计	1495.045749	1.00

2.绩效评价指标体系

指标体系由 4 个一级指标、10 个二级指标、23 个三级指标构成。数据主要来源于文件资料、问卷调查、访谈等。

(1) 决策：占权重分 20 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度考察项目立项依据充分性和程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及预算编制科学性、资金分配合理性等。

(2) 过程：占权重分 20 分，从资金管理和组织实施两个角度考察项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性以及组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开情况、档案资料完整性等。

(3) 产出：占权重分 30 分，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个角度考察项目总体目标完成率、完成及时性、质量达标率、成本节约率等。

(4) 效益：占权重分 30 分，从经济效益、社会效益、可持续性影响和满意度四个角度考察企业信息化水平提升、品牌效益增长、企业信息化能力建设等。

(五) 评价工作组

1.组织框架

本次绩效评价工作由山西冰佳项目管理有限责任公司承担。为使绩效评价工作顺利开展，成立绩效评价项目评价组，组成情况简要如下图：

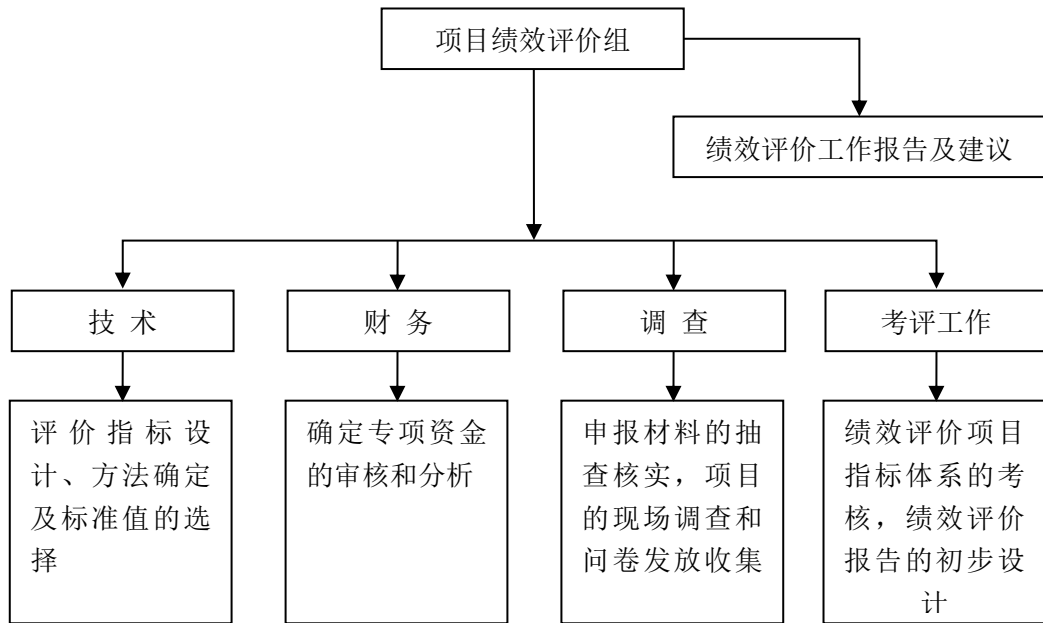


图 2-1 组织框架图

2.评价团队成员

评价组主要负责现场勘察，包括查阅收集相关的制度文件、财务资料等，开展问卷调查，撰写绩效评价方案和绩效评价报告等工作。

（六）绩效评价工作过程

根据财政部颁布执行的财预〔2020〕10号文件精神，项目绩效评价实施过程主要由以下几个步骤组成：

基于过程视角，本次绩效评价工作分为前期准备、现场核查和调研、评价报告撰写三个阶段。

1.前期准备阶段

(1)制定项目评价实施方案。评价机构收集、审核资料，根据项目具体情况制定绩效评价实施方案，并拟定评价指标体系，细化评分标准。

(2)确认项目评价实施方案。

2.现场实施阶段

(1)收集、审核资料。评价机构在全面收集资料的基础上，根据经审核后的评价实施方案，对已收集的资料进行分类整理、审查和分析。

(2)现场勘查。根据评价对象的特点和项目承担单位提供的数据资料，评价机构进行实地勘察验证。

(3)综合评价。评价机构根据评价实施方案确定的评价指标、评价权重、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面的定量定性分析和综合评价，形成评价结论。

3.评价报告撰写阶段

(1)撰写评价报告。评价机构根据被评价单位的绩效评价情况，按要求撰写评价报告。报告应包括以下主要内容：项目基本情况（政策背景、政策目标、政策内容、资金投入和项目实施情况）、绩效评价的组织实施情况、绩效评价指标体系、评价标准和评价方法、绩效目标实现情况分析和评价结论、项目主要经验和存在的问题及原因分析、政策建议及评价结果应用建议等。

(2)评价机构在征求相关部门（单位）意见后，对报告进行修改完善，将评价报告报送稷山县财政局。

(3)审核绩效评价报告。财政局组织专家对绩效评价报告进行评审，主要从报告内容完整性、评价方法的科学性、评价结论的合理性、问题分析的全面性、建议的可行性等方面进行审核，提出审核意见。

(4)专家组提交书面评价结果意见，并向评价机构反馈。

(5)评价机构根据专家意见修改评价报告，提交正式评价报告。

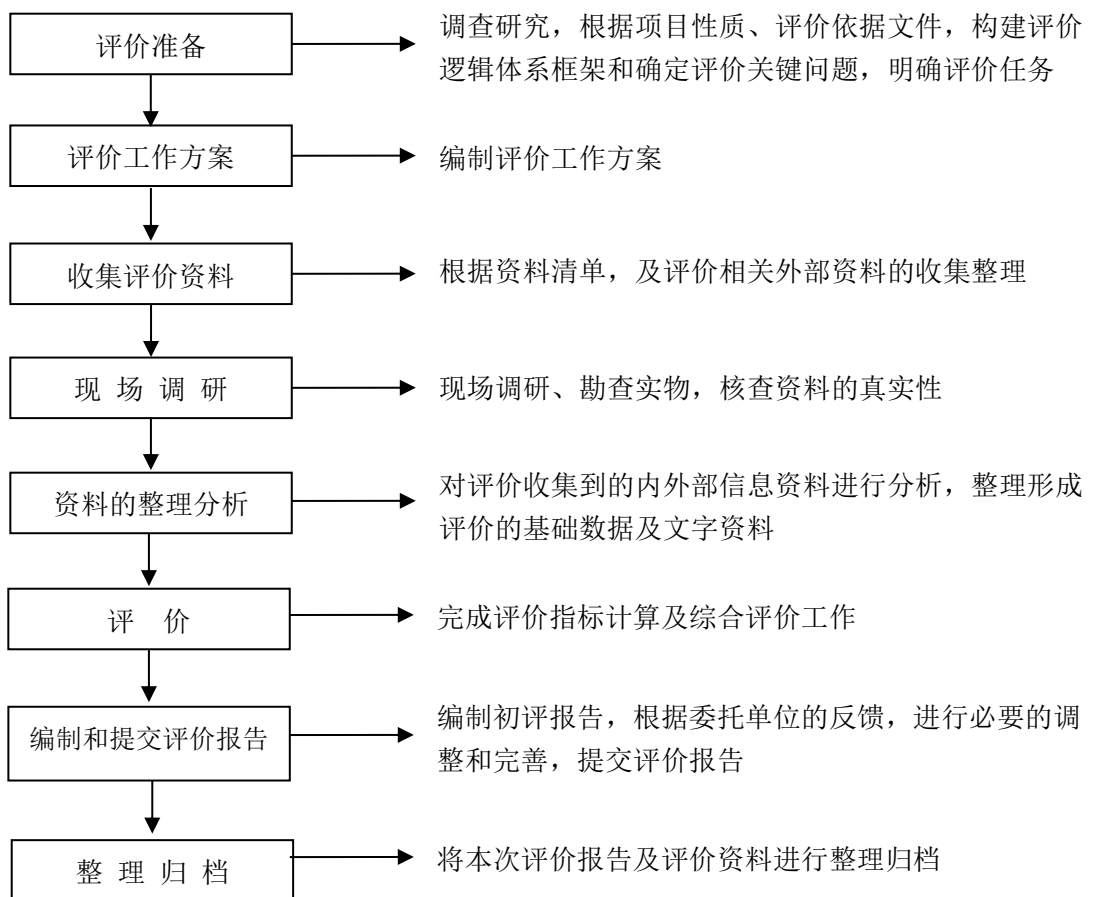


图 2-2 项目绩效评价流程图

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评价结果

本次绩效评价结果采用综合评分定级方法，总分为 100 分，绩效评级分为“优、良、中、差”四级。运用绩效评价组所研发的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、现场核查、问卷调查、现场访谈等方式对稷山县 2021 年度一事一议项目进行客观评价，最终评分结果为：总得分为 88.1 分，属于“良”。其中，决策、过程、产出、效益指标权重及得分情况见表 3-1 及表 3-2。

表 3-1 各村项目绩效评价得分情况表

项目村	项目投资	权重	绩效评价价值	综合得分
西薛村	147.7715	0.10	96.83	9.57
西店头村	189.128	0.13	96.79	12.24
阳史村	387.396451	0.26	96.96	25.12
阳城村	467.169798	0.31	82.85	25.89
店头村	20.69	0.01	93	1.29
太阳村	252.3	0.17	79.3	13.38
佛峪口村	30.59	0.02	64	1.31
合计	1495.045749	1.00		88.81

表 3-2 各乡镇项目绩效评价得分情况表

乡镇	项目投资	权重	绩效评价价值	综合得分
稷峰镇	724.295951	0.48	96.89	46.94
清河镇	487.859798	0.33	83.28	27.18
太阳乡	252.3	0.17	79.30	13.38
化峪镇	30.59	0.02	64.00	1.31
合计	1495.045749	1		88.81

(二) 评价结论

基于绩效分析与评价结果，评价结论为：

稷山县 2021 年度一事一议项目资金总计 1495.537862 万元，本年度收到财政奖补共计 1489.090462 万元，其中中央和省级财政资金 1112 万元，县级乡村振兴资金 377.090462 万元。筹资筹劳资金 6.4474 万元。截至 2023 年 3 月 1 日，项目资金到位 1205.464887 万元，其中包括筹资筹劳的 6.4474 万元。项目已支付资金 1093.892287 万元。具体来看，稷山县一事一议项目取得的主要绩效成果包括：

1.决策方面：立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学，为稷山县 2021 年度一事一议项目建设打下了坚实的基础。

2.过程方面：预算资金全部到位、预算执行率达标、制度执行较有效，为 24 个项目实施提供了资金保障。

3.产出方面：24 个项目均已完工，已验收部分除了一些项目建设内容变更较大，基本完成预计工程量，还有些项目未进行工程验收。

4.效益方面：24 个项目的实施，均为受众改善了人居环境，便利了日常生活，解决了稷山县当前农村亟待解决的民生短板问题，群众的满意度较高，为后续年度的一事一议项目开展，奠定了基础。

从全面实施预算绩效管理的角度来看，稷山县 2021 年度一事一议项目，因部分项目村工程相关资料不齐全以及项目验收滞后等原因，很大程度上影响了项目执行的绩效，影响了本次绩效

评价的分值。

四、绩效评价指标分析

根据项目特点，设置“项目决策、项目过程、项目产出、项目效益”4 个一级指标，并将其分解为 10 个二级指标、23 个三级指标。主要指标设置情况见表 4-11。

（一）项目决策指标绩效分析

项目决策类指标由 3 个二级指标（项目立项、绩效目标、资金投入）、7 个三级指标组成，权重分为 20 分。

表 4-1 决策指标得分明细表（各村）

	分值	西薛村	西店头村	阳史村	阳城村	店头村	太阳村	佛峪口村	项目得分
		0.10	0.13	0.26	0.31	0.01	0.17	0.02	
A101 项目选择依据充分性	2	2	2	2	2	2	2	1	1.98
A102 项目流程合规性	4	4	4	4	4	4	4	2	3.96
A103 方案编制完整性	2	2	2	2	1.5	1.5	2	0	1.80
A201 绩效目标合理性	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
A202 绩效指标明确性	3	2	2	2	2	2	2	2	2.00
A301 预算编制科学性	3	3	3	3	3	3	3	1	2.96
A302 资金分配合理性	3	3	3	3	3	3	3	3	3.00
总分值	20	19	19	19	18.5	18.5	19	12	18.69

1.A1 项目立项指标主要包括项目选择依据充分性、项目流程合规性、方案编制完整性 3 个指标，权重分值 8 分。该项目相

应的 3 级指标得分情况如下：

A101 项目选择依据充分性：该指标主要考核项目入库依据的充分性。通过一项目选择是否符合相关文件要求；二入库程序是否合规两个维度考察。通过现场访谈和查阅相关项目资料，各村项目立项，上报乡镇，依据相关规划初审项目，县级依据相关整体规划和一事一议政策文件审批上报入库。依据评分标准，本指标满分 2 分，6 个村实际得分均为 2 分，得分率 100%。佛峪口村实施的佛峪口舞台维修改造项目，未见到其项目立项依据等相关资料，但入库程序合规，因此扣 1 分，得分率 50%。

A102 项目流程合规性：该指标主要考核项目是否按照村级公益事业一事一议制度或程序进行。通过一项目决定是否按照一事一议相关制度和程序，召开村民代表大会确定，同时进行相应的公开程序，上报经乡镇初审，县级审批等流程；二项目筹资筹劳是否按照一事一议相关原则和程序，进行公示公开，相关台账清晰两个维度考察。依据评分标准，本指标满分 4 分，6 个村实际得分均为 4 分，得分率 100%。佛峪口村实施的佛峪口舞台维修改造项目，未见到其项目筹资筹劳相关资料，因此扣 2 分，得分率 50%。

A103 方案编制完整性：该指标主要考核项目实施方案编制是否科学合理。通过一项目是否制定工程前期实施方案；二项目实施方案内容是否具体详细，是否通过会议或公示充分征集村民

意见两个维度考察。依据评分标准，本指标满分 2 分，一是西薛村、西店头村、阳史村虽然没有独立的实施方案，但有项目规划书，具体地写明了相关项目具体建设内容，故这三个村此项得分为 2 分；二是阳城村和店头村也是没有独立的实施方案，但有项目规划书，但是相关具体实施内容不够具体，此项扣 0.5 分；三是太阳村实施太阳村建设改造项目有实施方案，工程具体的施工设计和预算的财政评审文件，故得 2 分；四是佛峪口村实施的佛峪口舞台维修改造项目，未见到其项目实施方案或项目具体规划等相关资料，此项不得分。

2.A2 项目绩效目标主要包括绩效目标合理性、绩效指标明确性 2 个指标，权重分值 6 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

A201 绩效目标合理性：该指标主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过一项目是否制订绩效目标申报表；二项目绩效目标与项目任务数或计划数是否相对应；三项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量是否相匹配三个维度考察。经审核相关资料，7 个项目实施村在预算申报时，设置和填报了绩效目标，主要从产出、效益、满意度三个方面进行绩效评价，依据评分标准，本指标满分 3 分，得分率 100%。

A202 绩效指标明确性：该指标主要考核项目设定的绩效指

标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过一绩效指标是否按照方案进行细化和量化；二绩效指标是否按照实施带来的社会、经济效益进行细化和量化；三绩效指标是否按照组织管理实施过程进行细化和量化三个维度考察。依据评分标准，本指标满分 3 分，7 个项目实施村上报的绩效目标均为产出结果性指标，所以此项指标 7 个项目实施村均扣 1 分。

3.A3 资金投入指标主要包括预算编制科学性和资金分配合理性 2 个指标，权重分值 6 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

A301 预算编制科学性：该指标主要评价项目资金使用预算编制的科学性、合理性。主要通过是否有科学的测算依据、预算编制的资金额度是否能够满足项目的目标任务、预算编制是否与相关文件相匹配三个方面来衡量。依据评分标准，本指标满分 3 分，6 个项目村均有每个项目的预算申请表，具体列明了建设内容与预算资金，且太阳村、阳城村、店头村均有财政预算评审报告，因此 6 个项目村均得 3 分。佛峪口村仅有其项目整体预算金额，未见其预算编制的相关资料，故扣 2 分。

A302 资金分配合理性：该指标主要评价财政预算专项支持资金分配的科学性、合理性。主要通过预算资金分配是否符合山西省财政预算资金要求；资金分配是否有合理的依据；资金分配

是否与任务相匹配三个方面来衡量。依据评分标准，本指标满分 3 分，通过与县财政局相关负责领导访谈，一事一议专项资金通过筛选入库项目覆盖面以及建设迫切程度，参考各个村、乡镇常住人口数，制定相关资金分配计划。此项指标 7 个项目村均得 3 分，得分率 100%。

（二）项目过程指标绩效分析

项目过程类指标由 2 个二级指标（资金管理、组织实施）、8 个三级指标组成，权重分为 20 分。

表 4-2 过程指标得分明细表（各村）

	分值	西薛村	西店头村	阳史村	阳城村	店头村	太阳村	佛峪口村	项目得分
		0.10	0.13	0.26	0.31	0.01	0.17	0.02	
B101 资金到位率	3	2.43	2.42	2.48	2.31	3	2.4	3	2.42
B102 预算执行率	3	2.40	2.40	2.47	1.95	0.00	2.40	0.00	2.20
B103 资金使用合规性	4	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
B201 组织机构健全性	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.96
B202 项目管理制度健全性	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	1.96
B203 制度执行有效性	3	3.00	3.00	3.00	2.50	3.00	0.00	0.00	2.28
B204 信息公开情况	2	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.50	1.97
B205 档案资料完整性	1	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.90

总分值	20	18.83	18.82	18.95	17.76	17	15.3	7.5	17.67
-----	----	-------	-------	-------	-------	----	------	-----	-------

1.B1 资金管理指标主要包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个指标，权重分值 10 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

B101 资金到位率：该指标主要评价实际到位预算资金与计划投入预算资金的比率，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位预算资金/计划投入预算资金）×100%。经现场对相关资料的核查，项目资金分为一事一议财政奖补资金和项目村筹资筹劳资金，7 个项目村筹资筹劳资金均上缴至乡镇政府，一事一议财政奖补资金由各乡镇根据项目实施进度提出资金拨付申请，县财政局拨付至乡镇政府。各乡镇资金到位情况见表 4-3。依据评分标准，本指标满分 3 分，7 个项目村得分情况见表 4-4。

表 4-3 各乡镇资金到位情况（单位：万元）

序号	主管单位	到位资金名称	到位时间	到位金额	预算投资	资金到位率
1	稷峰镇人民政府	小计		591.852287	724.295951	81.71%
		财政资金	2021.12.23	131.2644		
		财政资金	2022.4.27	63.8926		
		财政资金	2022.5.27	195.1571		
		财政资金	2022.8.16	130.1065		
		财政资金	2023.2.28	67.631687		
		筹劳筹资		3.8		
2	清河镇人民政府	小计		380.9802	487.859798	78.09%
		财政资金	2021.12.23	30		
		财政资金	2022.4.27	96		
		财政资金	2022.5.27	96		

		财政资金	2022. 8. 16	82		
		财政资金	2023. 2. 28	75. 1252		
		筹劳筹资		1. 855		
3	太阳乡人民政府	小计		202. 0424	252. 3	80. 08%
		财政资金	2022. 4. 27	75. 69		
		财政资金	2022. 5. 27	126. 15		
		筹劳筹资		0. 2024		
4	化峪镇人民政府	小计		30. 59	30. 59	100. 00%
		财政资金	2023. 2. 28	30		
		筹劳筹资		0. 59		
		合计		1205. 464887	1495. 045749	80. 63%

表 4-4 各项目村资金到位情况及资金到位率得分

序号	实施单位	预算投资	到位资金	资金到位率	得分
1	西薛村	147. 7715	119. 6618	80. 98%	2. 43
2	西店头村	189. 128	152. 3524	80. 56%	2. 42
3	阳史村	387. 396451	319. 838087	82. 56%	2. 48
稷峰镇小计		724. 295951	591. 852287	81. 71%	
4	阳城村	467. 169798	360. 2902	77. 12%	2. 31
5	店头村	20. 69	20. 69	100. 00%	3. 00
清河镇小计		487. 859798	380. 9802	78. 09%	
6	太阳村	252. 3	202. 0424	80. 08%	2. 40
太阳乡小计		252. 3	202. 0424	80. 08%	
7	佛峪口村	30. 59	30. 59	100. 00%	3. 00
化峪镇小计		30. 59	30. 59	100. 00%	
总计		1495. 045749	1205. 464887	80. 63%	

B102 预算执行率：考察项目单位对项目支出预算的执行情况。通过实地查看项目进展和查阅资金账户支出明细等资料，预算执行率得分=实际支出数/预算资金数×权重分，依据评分标准，本指标满分 3 分，截至 2023 年 3 月 1 日，7 个项目村的预算执行率及得分见下表 4-5。

表 4-5 各项目预算执行情况 (单位: 万元)

序号	主管单位	实施单位	项目名称	项目预算	实际支付	预算执行率	得分
1	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村建筑外立面装饰、街巷硬化、污水管及残垣断壁修复工程	24.78	19.824	80.00%	
2	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村群众文化活动中心	122.9915	98.3878	80.00%	
		西薛村		147.7715	118.2118	80.00%	2.40
3	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头主街道下水道改造工程	54.33	43.464	80.00%	
4	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头通村道路提升改造及街道硬化工程	51.14	40.912	80.00%	
5	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头残垣断壁修复、墙体立面装饰及人行道修复工程	24.36	19.488	80.00%	
6	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头文化广场提升改造工程	59.298	47.4384	80.00%	
		西店头村		189.128	151.3024	80.00%	2.40
7	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升(洞子门修复)工程	34.07	27.256	80.00%	
8	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌美化(建筑外立面装饰及精神堡垒改造)工程	18.85	15.08	80.00%	
9	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村路灯安装工程	14.8	11.84	80.00%	
10	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村文化广场提升改造工程	38.27	30.616	80.00%	
11	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村游园改造工程	59.17	47.336	80.00%	
12	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村下水道改造及混凝土路面恢复工程	58.48	46.784	80.00%	
13	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村庄绿化工程	14.8859	14.8859	100.00%	
14	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史环村护坡绿化工程	13.222147	13.222147	100.00%	

15	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村美丽乡村建设工程	14.996585	14.996585	100.00%	
16	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史主街道改造工程	30.658819	24.527055	80.00%	
17	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（挡土墙）工程	89.993	71.9944	80.00%	
		阳史村		387.396451	318.538087	82.23%	2.47
18	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目	320.413	256	79.90%	
19	清河镇人民政府	阳城村	阳城村吃水管网改造工程	49.165	48	97.63%	
20	清河镇人民政府	阳城村	阳城研学基地改造工程	51.6956	0	0.00%	
21	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目附属工程	45.896198	0	0.00%	
		阳城村		467.169798	304	65.07%	1.95
22	清河镇人民政府	店头村	店头村公共活动场所	20.69	0	0.00%	
		店头村		20.69	0	0.00%	0.00
23	太阳乡人民政府	太阳村	太阳村建设改造项目	252.3	201.84	80.00%	
		店头村		252.3	201.84	80.00%	2.40
24	化峪镇人民政府	佛峪口村	佛峪口舞台维修改造	30.59	0	0.00%	
		店头村		30.59	0	0.00%	0.00

B103 资金使用合规性：考核项目资金使用是否有合规的支出依据，是否存在虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准或范围使用情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。根据相关资料的查阅，依据评分标准，本指标满分 4 分，7 个项目村资金使用合规，此项指标均得 4 分。

2.B2 组织实施指标主要包括组织机构健全性、项目管理制度健全性、制度执行有效性、信息公开情况、档案资料完整性 5 个指标，权重分值 10 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

B201 组织机构健全性：该指标主要考核项目相关工作组是否健全、分工是否明确，是否能够保证整个项目组织管理流程的畅通。通过一项目是否成立专门的工作领导小组或专门机构；二项目各部门及人员责任是否明确，各司其职两个维度考察。根据相关资料的查阅，依据评分标准，本指标满分 2 分，6 个项目村均有对应的乡镇工作领导小组，均得 2 分。佛峪口村未提供相关资料，此项不得分。

B202 项目管理制度健全性：考核项目管理单位或实施单位的业务管理制度是否健全完善，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。通过一项目是否制定或具有相应的业务管理制度；二项目管理部门是否形成项目工作开展总结性材料两个维度考察。依据评分标准，本指标满分 2 分，通过与该项目

的相关负责人座谈和查阅相关资料可知，6 个项目村均有相关管理制度，均得 2 分。佛峪口村未见有相关管理制度，此项不得分。

B203 制度执行有效性：考核项目实施单位相关管理制度的执行情况。通过一项目是否采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式对实施内容进行择优采购；二项目调整和支出手续是否完备；三项目招投标文件、合同书、竣工报告等资料是否完善并及时归档三个维度考察。依据评分标准，本指标满分 3 分，通过查阅相关资料可知，稷峰镇的西薛村、西店头村、阳史村以及清河镇的头村均有相关手续文件，这 4 个项目村得 3 分；清河镇的阳城村有 3 个项目，已完工但未进行工程验收流程，因此没有相关验收资料，扣 0.5 分；太阳村和佛峪口村未能提供相应的文件资料，故此项不得分。

B204 信息公开情况：考核项目相关信息公示情况。通过一项目公开项目实施的相关信息；二项目是否及时上报实施方案和总结材料的两个维度考察。依据评分标准，本指标满分 2 分，通过查阅相关资料可知，6 个项目村均有“四议两公开”相关制度与流程，且均有相关台账资料，故此项 6 个项目村均得 2 分；佛峪口村也有“四议两公开”相关制度与流程，但未见到项目实施的相关台账资料，无法佐证，且上报资料不及时，故扣 1.5 分。

B205 档案资料完整性：考核项目资料完整情况。依据评分标准，本指标满分 1 分，通过查阅相关资料可知，5 个项目村项

目资料完整,与实际项目推进程度相符,故 5 个项目村均得 1 分;太阳村提供了相关的项目资料,但不完整,缺少相关的施工方资料、招投标资料以及相关工程验收资料,故此项扣 0.5 分;佛峪口村未能提供项目相关的资料,故此项不得分。

(三) 项目产出指标绩效分析

项目产出类指标由 3 个二级指标(数量、质量、产出时效)、3 个三级指标组成,权重分为 30 分。

表 4-6 产出指标得分明细表(各村)

	分值	西薛村	西店头村	阳史村	阳城村	店头村	太阳村	佛峪口村	项目得分
		0.10	0.13	0.26	0.31	0.01	0.17	0.02	
C101 工程内容完成率	10	9	8.97	9.01	5.53	10	5	5	7.17
C201 工程质量合格率	10	10	10	10	5.53	8	5	5	7.63
C301 工程完成及时率	10	10	10	10	5.53	10	5	5	7.66
总分值	30	29	28.97	29.01	16.59	28	15	15	22.46

1.C1 数量指标主要包括工程内容完成率 1 个指标,权重分值 10 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下:

C101 工程内容完成率:该指标主要工程验收报告工程内容与前期实施方案计划工程内容数量的比值,用以反映和考核项目完成情况。依据评分标准,本指标满分 10 分,通过查阅相关资料与实地查看,7 个项目村共计 24 个项目,工程内容完工情况及得分见表 4-7。

2.C2 质量指标主要包括工程质量合格率 1 个指标,权重分

值 10 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

C201 工程质量合格率：该指标主要考核项目建设任务质量完成情况。工程质量合格率应为 100%。依据评分标准，本指标满分 10 分，通过查阅相关资料与实地查看，7 个项目村共计 24 个项目，工程质量合格情况及得分见表 4-8。

3.C3 产出时效指标包括工程完成及时率 1 个指标，权重分值 10 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

C301 工程完成及时率：该指标主要考核工程建设整体进度情况。依据评分标准，本指标满分 10 分，通过查阅相关资料与实地查看，7 个项目村共计 24 个项目，工程完成及时情况及得分见表 4-9。

表 4-7 工程内容完工情况及得分

序号	主管单位	实施单位	项目名称	项目验收内容	项目投资金额	项目在本村权重	得分
1	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村建筑外立面装饰、街巷硬化、污水管及残垣断壁修复工程	有核减	24.78	16.77%	9
2	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村群众文化活动中心	有较多变动	122.9915	83.23%	9
西薛村					147.7715		9.00
3	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头主街道下水道改造工程	有较多变动	54.33	28.73%	9
4	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头通村道路提升改造及街道硬化工程	有较多变动	51.14	27.04%	9
5	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头残垣断壁修复、墙体立面装饰及人行道修复工程	有增加	24.36	12.88%	10
6	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头文化广场提升改造工程	有过多变动	59.298	31.35%	8.5
西店头村					189.128		8.97
7	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升(洞子门修复)工程	有过多变动	34.07	8.79%	8.5
8	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌美化(建筑外立面装饰及精神堡垒改造)工程	有增加	18.85	4.87%	10
9	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村路灯安装工程	更换计划全部路灯规格	14.8	3.82%	8
10	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村文化广场提升改造工程	有较多变动	38.27	9.88%	9
11	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村游园改造工程	有过多变动	59.17	15.27%	8.5
12	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村下水道改造及混凝土路面恢复工程	有过多变动	58.48	15.10%	8.5

13	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村庄绿化工程		14.8859	3.84%	10
14	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史环村护坡绿化工程		13.222147	3.41%	10
15	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村美丽乡村建设工程		14.996585	3.87%	10
16	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史主街道改造工程	变动较小	30.658819	7.91%	10
17	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（挡土墙）工程	有较多变动	89.993	23.23%	9
阳史村					387.396451		9.01
18	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的数量上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	320.413	68.59%	5
19	清河镇人民政府	阳城村	阳城村吃水管网改造工程	计划：自来水管改造 20162 米，安装 510 户；实际：切割开挖 960 处、管路预管 20162 米、机械开挖回填 1400 米、路面恢复 960 处、垃圾清运 960 处、变频增压泵 1 台、接南阳水管 380 米	49.165	10.52%	10
20	清河镇人民政府	阳城村	阳城研学基地改造工程	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的数量上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	51.6956	11.07%	5
21	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目附属工程	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的数量上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	45.896198	9.82%	5
阳城村					467.169798		5.53
22	清河镇人民政府	店头村	店头村公共活动场所		20.69	100.00%	10
店头村					20.69		
23	太阳乡人民政府	太阳村	太阳村建设改造项目	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的数量上来确定工程的完	252.3	100.00%	5

				工情况，且未提供工程的过程性资料			
太阳村					252.3		5
24	化峪镇人民政府	佛峪口村	佛峪口舞台维修改造	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的数量上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	30.59	100.00%	5
佛峪口村					30.59		5

表 4-8 工程质量合格情况及得分

序号	主管单位	实施单位	项目名称	工程质量合格率	项目投资金额	项目在本村权重	得分
1	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村建筑外立面装饰、街巷硬化、污水管及残垣断壁修复工程	100%	24.78	16.77%	10
2	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村群众文化活动中心	100%	122.9915	83.23%	10
西薛村					147.7715		10.00
3	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头主街道下水道改造工程	100%	54.33	28.73%	10
4	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头通村道路提升改造及街道硬化工程	100%	51.14	27.04%	10
5	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头残垣断壁修复、墙体立面装饰及人行道修复工程	100%	24.36	12.88%	10
6	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头文化广场提升改造工程	100%	59.298	31.35%	10
西店头村					189.128		10.00
7	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（洞子门修复）工程	100%	34.07	8.79%	10
8	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌美化（建筑外立面装饰及精神堡垒改造）工程	100%	18.85	4.87%	10
9	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村路灯安装工程	100%	14.8	3.82%	10
10	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村文化广场提升改造工程	100%	38.27	9.88%	10
11	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村游园改造工程	100%	59.17	15.27%	10
12	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村下水道改造及混凝土路面恢复工程	100%	58.48	15.10%	10
13	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村庄绿化工程	100%	14.8859	3.84%	10

14	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史环村护坡绿化工程	100%	13.222147	3.41%	10
15	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村美丽乡村建设工程	100%	14.996585	3.87%	10
16	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史主街道改造工程	100%	30.658819	7.91%	10
17	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升（挡土墙）工程	100%	89.993	23.23%	10
阳史村					387.396451		10.00
18	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的质量指标上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	320.413	68.59%	5
19	清河镇人民政府	阳城村	阳城村吃水管网改造工程	100%	49.165	10.52%	10
20	清河镇人民政府	阳城村	阳城研学基地改造工程	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的质量指标上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	51.6956	11.07%	5
21	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目附属工程	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的质量指标上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	45.896198	9.82%	5
阳城村					467.169798		5.53
22	清河镇人民政府	店头村	店头村公共活动场所		20.69	100.00%	8
店头村					20.69		

23	太阳乡人民政府	太阳村	太阳村建设改造项目	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的质量指标上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	252.3	100.00%	5
太阳村					252.3		5
24	化峪镇人民政府	佛峪口村	佛峪口舞台维修改造	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从具体的质量指标上来确定工程的完工情况，且未提供工程的过程性资料	30.59	100.00%	5
佛峪口村					30.59		5

表 4-9 工程完成及时情况及得分

序号	主管单位	实施单位	项目名称	项目计划起止时间	项目实际起止时间	项目投资金额	项目在本村权重	得分
1	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村建筑外立面装饰、街巷硬化、污水管及残垣断壁修复工程	50 天	2021.12.5-2022.1.24(50)	24.78	16.77%	10
2	稷峰镇人民政府	西薛村	西薛村群众文化活动中心	2022.3.18-2022.5.17 (60 天)	2022.3.18-2022.5.17 (60 天)	122.9915	83.23%	10
西薛村						147.7715		10.00
3	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头主街道下水道改造工程	2021.12.5-2022.1.19 (45)	2021.12.5-2022.1.19(45)	54.33	28.73%	10
4	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头通村道路提升改造及街道硬化工程	2021.12.5-2022.1.19 (45)	2021.12.5-2022.1.19(45)	51.14	27.04%	10
5	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头残垣断壁修复、墙体立面装饰及人行道修复工程	2021.12.5-2022.1.19 (45)	2021.12.5-2022.1.19(45)	24.36	12.88%	10
6	稷峰镇人民政府	西店头村	西店头文化广场提升改造工程	2021.12.5-2022.1.19 (45)	2021.12.5-2022.1.19(45)	59.298	31.35%	10
西店头村						189.128		10.00
7	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升(洞子门修复)工程	2021.12.10-2022.1.10 (30)	2021.12.10-2022.1.10(30)	34.07	8.79%	10
8	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌美化(建筑外立面装饰及精	2021.12.10-2022.1.10 (30)	2021.12.10-2022.1.10(30)	18.85	4.87%	10

			神堡垒改造) 工程					
9	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村路灯安装工程	2021. 12. 10-2022. 1. 10(30)	2021. 12. 10-2022. 1. 10(30)	14. 8	3. 82%	10
10	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村文化广场提升改造工程	2021. 12. 5-2022. 1. 20(45)	2021. 12. 5-2022. 1. 20(45)	38. 27	9. 88%	10
11	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村游园改造工程	2021. 12. 5-2022. 2. 5(60)	2021. 12. 5-2022. 2. 5(60)	59. 17	15. 27%	10
12	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村下水道改造及混凝土路面恢复工程	2021. 12. 5-2022. 2. 5(60)	2021. 12. 5-2022. 2. 5(60)	58. 48	15. 10%	10
13	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村庄绿化工程	2022. 11. 7-2022. 11. 21(15)	2022. 11. 7-2022. 11. 21(15)	14. 8859	3. 84%	10
14	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史环村护坡绿化工程	2022. 11. 7-2022. 11. 21(15)	2022. 11. 7-2022. 11. 21(15)	13. 222147	3. 41%	10
15	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村美丽乡村建设工程	2022. 11. 7-2022. 11. 21(15)	2022. 11. 7-2022. 11. 21(15)	14. 996585	3. 87%	10
16	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史主街道改造工程	2021. 11. 24-2021. 12. 23(30)	2021. 11. 24-2021. 12. 23(30)	30. 658819	7. 91%	10
17	稷峰镇人民政府	阳史村	阳史村村容村貌提升(挡土墙) 工程	2022. 3. 18-2022. 5. 2(45)	2022. 3. 18-2022. 5. 2(45)	89. 993	23. 23%	10
			阳史村			387. 396451		10. 00
18	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目	2022. 3. 18-2022. 6. 17	项目已完工, 但项目未验收, 只有现场相关情况及其照片, 无法从确定项目具体的完工时间, 且未提供工程的过程性资料	320. 413	68. 59%	5
19	清河镇人	阳城村	阳城村吃水管网改造工	2021. 11. 22-2021. 12.	2021. 11. 22-2021. 12. 30	49. 165	10. 52%	10

	民政府		程	30				
20	清河镇人民政府	阳城村	阳城研学基地改造工程	2022. 11. 1-2022. 12. 1 5	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从确定项目具体的完工时间，且未提供工程的过程性资料	51.6956	11.07%	5
21	清河镇人民政府	阳城村	阳城村改造建设项目附属工程	2023. 1. 8-2023. 2. 28	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从确定项目具体的完工时间，且未提供工程的过程性资料	45.896198	9.82%	5
			阳城村			467.169798		5.53
22	清河镇人民政府	店头村	店头村公共活动场所	50 天	65 天	20.69	100.00%	8
			店头村			20.69		
23	太阳乡人民政府	太阳村	太阳村建设改造项目	未提供基础资料	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从确定项目具体的完工时间，且未提供工程的过程性资料	252.3	100.00%	5
			太阳村			252.3		5
24	化峪镇人民政府	佛峪口村	佛峪口舞台维修改造	未提供基础资料	项目已完工，但项目未验收，只有现场相关情况及其照片，无法从确定项目具体的完工时间，且未提供工程的过程性资料	30.59	100.00%	5
			佛峪口村			30.59		5

(四) 项目效益指标绩效分析

项目效益类指标由 2 个二级指标（项目实施效益、满意度）、5 个三级指标组成，权重分为 30 分。

表 4-10 效益指标得分明细表（各村）

	分值	西薛村	西店头村	阳史村	阳城村	店头村	太阳村	佛峪口村	项目得分
		0.10	0.13	0.26	0.31	0.01	0.17	0.02	
D101 生态效益	6	6	6	6	6	5.5	6	5.5	5.98
D102 社会效益	6	6	6	6	6	6	6	6	6
D103 可持续影响	6	6	6	6	6	6	6	6	6
D201 服务对象满意度	6	6	6	6	6	6	6	6	6
D202 社会公众满意度	6	6	6	6	6	6	6	6	6
总分值	30	30	30	30	30	29.5	30	29.5	29.98

1.D1 项目实施效益指标包括生态效益、社会效益、可持续影响 3 个指标，权重分值 18 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

D101 生态效益：该指标主要评价通过项目实施，取得一定生态效益。通过项目实施是否带动当地人居环境改善，基础设施改善，生态环境改善来考察。依据评分标准，本指标满分 6 分，通过查阅相关资料与实地查看，除了店头村和佛峪口村的项目，未有直接明显的生态效益，其余 5 个村均涉及生态环境改善的内容，因此店头村与佛峪口村核减 0.5 分。

D102 社会效益：该指标主要评价通过项目实施，取得社会

公共服务提升的效益。通过项目实施是否改善居住出行等生活条件，带动美丽乡村建设来考察。依据评分标准，本指标满分 6 分，通过查阅相关资料与实地查看，本次实施的 24 个项目，大致可以分为三类，一是基础设施完善类，对农村人居环境有很大的改善作用，解决了较大的安全隐患；二是自然环境优化类，对环境进行绿化和保护，提升居住环境的舒适度；三是人文环境改善类，通过对公共娱乐等场所的改造，增加和改善村民进行娱乐等活动的场所，丰富精神活动，更好发扬社会主义核心价值观。

D103 可持续影响：该指标主要评价实施项目可持续发挥作用的年限。通过项目建设是否能长时间地为群众提供便利，是否可以持续性地发挥作用，是否建立长效管护机制来考察。依据评分标准，本指标满分 6 分，通过查阅相关资料与实地查看，本次项目对项目实施地的人居环境、自然环境以及人文环境，都有较大的改善，并且为后续美丽乡村建设及相关乡村产业发展奠定了一定的基础，因此均有较为持续的有利影响，并且基本建立了长效管护机制。

2.D2 满意度指标包括服务对象满意度、社会公众满意度 2 个指标，权重分值 12 分。该项目相应的 3 级指标得分情况如下：

D201 服务对象满意度：主要评价实施项目的受众满意程度。依据评分标准，本指标满分 6 分，通过发放调查问卷和现场询问等形式，项目受众对 2021 年一事一议项目的满意度较好，

主要影响满意度的因素有因为疫情原因，导致项目的延迟实施，给大家的日常生活带来了不便。

D202 社会公众满意度：主要评价实施项目的受众满意程度。依据评分标准，本指标满分 6 分，通过发放调查问卷和现场询问等形式，社会公众对村级公益事业建设一事一议制度满意度很高，切实能解决身边的基础民生问题，对改善和提升大家的生活环境有很大的帮助，通过适当的筹资筹劳，让大家参与其中，激励大家参与监督，自觉维护项目成果。

表 4-11 稷山县一事一议项目绩效评价明细表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	指标说明	评分标准	依据
A 决策 (20)	A1 项目立项 (8)	A101 项目选择依据充分性	2	考核项目入库依据的充分性。	①项目选择符合相关文件要求，得 1 分，否则不得分； ②入库程序合规，得 1 分，否则不得分。	与主管部门领导的访谈，出台的相关政策文件
		A102 项目流程合规性	4	考核项目是否按照村级公益事业一事一议制度或程序进行。	①项目决定按照一事一议相关制度和程序，召开村民代表大会确定，同时进行相应的公开程序，上报经乡镇初审，县级审批等流程，得 2 分，否则不得分； ②项目筹资筹劳按照一事一议相关原则和程序，进行公示公开等程序，相关台账清晰，得 2 分，否则不得分。	一事一议项目流程文件
		A103 方案编制完整性	2	考核项目实施方案编制是否科学合理。	①实施项目制定工程前期实施方案，得 1 分，否则不得分； ②实施方案内容具体详细，通过会议或公示充分征集村民意见，得 1 分，根据实际实现情况酌情扣减。	项目实施方案等资料
	A2 绩效目标 (6)	A201 绩效目标合理性	3	考核项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目制订绩效目标申报表，得 1 分，否则不得分； ②与项目任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分； ③与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得 1 分，否则不得分。	相关制度流程文件、申报材料

		A202 绩效指标明确性	3	考核项目设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①绩效指标按照方案进行细化和量化，得 1 分，否则不得分； ②绩效指标按照实施带来的社会、经济效益进行细化和量化，得 1 分，否则不得分； ③绩效指标按照组织管理实施过程进行细化和量化，得 1 分，否则不得分。	相关制度流程文件、申报材料
	A3 资金投入 (6)	A301 预算编制科学性	3	主要通过是否有科学的测算依据、预算编制的资金额度是否能够满足项目的目标任务、预算编制是否与相关文件相匹配三个方面来衡量。	①预算编制有科学的测算依据，得 1 分，否则不得分； ②预算编制的资金额度能够满足项目的目标任务，得 1 分，否则不得分； ③预算编制与实施方案内容相匹配，得 1 分，否则不得分。	相关制度流程文件、申报材料
		A302 资金分配合理性	3	主要通过预算资金分配是否符合山西省财政预算资金要求；资金分配是否有合理的依据；资金分配是否与任务相匹配三个方面来衡量。	①资金分配符合中央、省财政预算资金，得 1 分，否则不得分； ②资金分配有合理的依据，得 1 分，否则不得分； ③资金分配符合村级公益事业建设一事一议相关制度，得 1 分，否则不得分。	相关制度流程文件、申报材料
B 过程 (20)	B1 资金管理 (10)	B101 资金到位率	3	实际到位预算资金与计划投入预算资金的比率，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	①得分=预算资金到位率×3 计算得分； ②预算资金到位率≤60%时，得 0 分。 资金到位率=（实际到位预算资金/计划投入预算资金）×100%。 实际到位预算资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的预算资金。 计划投入预算资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的预算资金。	预算资金拨付文件、财务凭证

	B102 预算执行率	3	实际支出数与预算资金数的比率，用以反映项目预算执行的进度。	①实际支出数/预算资金数×100%×3 计算得分； ②执行率低于 60%不得分。	相关资金文件、入账凭证、结算资料
	B103 资金使用合规性	4	考核项目资金使用是否有合规的支出依据，是否存在虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准或范围使用情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目总资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，得 1 分，否则不得分； ②项目预算资金的拨付有完整的审批程序和手续，匹配资金获得渠道符合规定，得 1 分，否则不得分； ③不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 2 分，否则不得分。	现场核查、相关制度文件、访谈
B2 组织实施 (10)	B201 组织机构健全性	2	考核项目相关工作组是否健全、分工是否明确，是否能够保证整个项目组织管理流程的畅通。	①成立专门的工作领导小组或专门机构，得 1 分，否则不得分； ②各部门及人员责任明确，各司其职，得 1 分，否则不得分。	现场核查、相关制度流程文件、访谈
	B202 项目管理制度健全性	2	考核项目管理单位或实施单位的业务管理制度是否健全完善，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的业务管理制度，得 1 分，否则不得分； ②管理部门形成项目工作开展总结性材料得 1 分，否则不得分。	现场核查、相关制度流程文件、访谈
	B203 制度执行有效性	3	考核项目实施单位相关管理制度的执行情况。	①采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商等方式对实施内容进行择优采购，得 1 分，否则该项不得分； ②项目调整和支出手续完备，得 1 分，否则该项不得分； ③项目招投标文件、合同书、竣工报告等资料完善并及时归档，得 1 分，否则该项不得分。	现场核查、相关制度流程文件、访谈

		B204 信息公开情况	2	考核项目相关信息公示情况。	①公开项目实施的相关信息，得 0.5 分，否则不得分； ②及时上报实施方案和总结材料的，得，0.5 分，报送不及时和未报送不得分。	现场核查、相关制度流程文件、访谈
		B205 档案资料完整性	1	考核项目资料完整情况。	①档案资料完整、规范得 1 分； ②不完整、不规范得 0.5 分； ③没有档案不得分。	现场核查、相关制度流程文件、访谈
C 产出 (30)	C1 数量指标 (10)	C101 工程内容完成率	10	工程验收报告工程内容与前期实施方案计划工程内容数量的比值，用以反映和考核项目完成情况。	按工程要求和标准工程，完成实施方案制定的工程量，得 10 分，实际完成率得分=(实际完成工程量/方案计划工程量)×100%×权重分。如有与实施方案有较大出入，依据实际情况酌情扣减。	工程相关资料
	C2 质量指标 (10)	C201 工程质量合格率	10	工程验收报告对工程质量的考核情况。	按工程要求和标准工程，工程质量全部合格，得 10 分，实际合格率得分=(合格工程量/工程总量)×100%×权重分。	工程相关资料
	C3 产出时效 (10)	C301 工程完成及时率	10	是否根据实施方案，按期完成各项工程内容，并经过验收	参照工程实施方案或者申报资料计划的工期，如期完成任务，得 10 分，进度完成率得分=实际完成率*权重分，其他特殊情况根据实际情况调整给分。	工程相关资料
D 效益 (30)	D1 项目实施效益	D101 生态效益	6	通过项目实施，取得一定生态效益。	项目实施带动当地人居环境改善，基础设施改善，生态环境改善，得 6 分，根据实际实现情况酌情扣减。	现场核查、相关证明材料
		D102 社会效益	6	通过项目实施，取得社会公共服务提升的效益。	项目实施改善居住出行等生活条件，带动美丽乡村建设，得 6 分，根据实际实现情况酌情扣减。	现场核查、相关证明材料

	D103 可持续影响	6	实施项目可持续发挥作用的年限。	项目建设能长时间地为群众提供便利，可以持续性地发挥作用，得 6 分，根据实际实现情况酌情扣减。	现场核查、相关证明资料
D2 满意度 (12)	D201 服务对象满意度	6	实施项目受众满意程度。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对受益对象满意度进行调查，达到 90%（含）以上，得 6 分；得分=满意度×6 分。	调查问卷
	D202 社会公众满意度	6	社会公众对一事一议制度满意程度。	通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，开展社会公众对一事一议制度的满意度调查，达到 90%（含）以上，得 6 分；得分=满意度×6 分。	调查问卷

五、存在的问题和建议

（一）存在问题

1.资金使用单位缺乏绩效管理理念

经与资金使用单位管理人员交流沟通，并查阅各项管理制度了解到，目前项目单位的工作实施重点和资金管理重点，仍然停留在是否按计划完成任务、有无违规违纪问题等传统管理层面上，对绩效理念、资金效益、绩效管理比较缺乏，绩效考核过于注重结果，而忽略了各个环节的执行。

2.项目实施过程要求缺少规范与标准

通过项目相关资料的查阅，发现一事一议项目实施过程缺少对项目实施质量以及项目实施进度的监督管理。对于不同投资金额的项目，缺少分类标准以及分类要求。对项目前期规划与预算缺少相关要求，导致前期准备不足，项目建设内容变动较多，工期延长。

（二）相关建议

1.立足实际，精准追踪。根据项目实施的具体情况，涉及的各级相关部门应采取定期与不定期相结合的方式，对项目资金使用情况，掌握了解，监督项目进度与质量。

2.加强督促，确保落地。针对项目实施的实际情况，了解项目实施的各方面状况，了解项目实施过程中存在的困难和问题，及时沟通、反馈与解决，推进项目按时保质地落地。

3.完善流程，规范实施。针对村级公益事业建设一事一议项目，根据相关政策文件和稷山县本地情况与实际，完善从项目立项，上报，审批到落地实施，再到过程中的资料整理存档的流程，形成相关制度性要求，规范一事一议项目的实施，从而提高项目资金的使用效率与安全。

六、下一步改进意见

1.各乡镇政府应严格执行年度预算，进行正确的财务核算，对本项目未使用资金考虑合理安排，以保证资金的安全高效使用。

2.各乡镇政府应严格执行有关规定，追踪并监督各村项目资金的使用，推动项目及时落地。

3.各乡镇政府应制定相关项目管理制度，及时完整的收集整理相关档案资料，以保障项目实施，提高财政资源配置效率和使用效益，提高预算管理水平和政策实施效果。

七、绩效评价结果应用建议

绩效评价结果应用既是进一步开展绩效管理工作的基本前提，又是加强财政支出管理，增强资金绩效理念，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平和提高资金使用效益的重要手段。

为使绩效评价结果得到合理的应用，特提出如下几条绩效评价结果应用建议供参考：

1.建立评价结果反馈告知程序，强化评价结果应用

稷山县财政局可以“绩效评价结果反馈告知书”形式，将评价项目绩效分值、等级、存在的问题及相关建议及时反馈给各项目实施单位，使其了解绩效评价结果，有助于其发扬成绩，整改问题，引申并延续绩效评价结果的导向与激励作用，并起到相应的社会监督作用。

2.规范专项资金支出管理，提高财政资金安排的科学性

稷山县财政局在下达资金指标文件和拨付专项资金时，做好项目预算执行管理办法，考虑项目资金的结余，并提出处理意见，便于操作。

3.加强内部协调，建立与资金预算相结合的应用机制

稷山县财政局应加强内部协调与配合，建立与部门预算相结合的应用机制，根据绩效评价等级作为综合平衡考虑的依据来进行预算管理，要实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

4.加强绩效目标管理

主管部门应加强项目预算绩效目标的审核管理，对于绩效目标不够细化、量化、明确的情况，要求相关单位进行修改完善，直至符合要求为止，否则不予批复预算。
